ID	Način opravila	Ime opravila	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila
1		**Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in**	**1209 dnevi**	**Čet 31.08.17**	**Tor 19.04.22**	
2		**PROJEKTRANJE IN IZVEDBA DEL**	**1209 dnevi**	**Čet 31.08.17**	**Tor 19.04.22**	
3		UVEDBA IZVAJALCA V DELO	0 dnevi	Čet 31.08.17	Čet 31.08.17	
4		**odsek d.m.-Dobova-Zidani Most**	**391 dnevi**	**Čet 31.08.17**	**Čet 28.02.19**	
5		uvedba izvajalca v delo za odsek d.m.-Dobova-Zidani Most	0 dnevi	Čet 31.08.17	Čet 31.08.17	3
6		priprava projektne dokumentacije (izdelava, revizija in izdaja Sklepa o uspešno opravljeni	66 dnevi	Čet 31.08.17	Čet 30.11.17	5
7		**vgradnja sistema ERTMS/ETCS na odseku d.m.-Dobova-Zidani Most**	**325 dnevi**	**Pet 1.12.17**	**Čet 28.02.19**	
8		vgradnja sistema ERTMS/ETCS na odseku d.m.-Dobova-Zidani Most	233 dnevi	Pet 1.12.17	Tor 23.10.18	6
9		ES potrdilo o skladnosti s TSI	0 dnevi	Tor 23.10.18	Tor 23.10.18	8
10		poskusno obratovanje in predaja odsek	66 dnevi	Sre 24.10.18	Sre 23.01.19	9
11		ES izjava o skladnosti s TSI	0 dnevi	Sre 23.01.19	Sre 23.01.19	10
12		KONČNI TEHNIČNI PREGLED	0 dnevi	Pet 1.02.19	Pet 1.02.19	11KZ+7 dnevi
13		**OBRATOVALNO DOVOLJENJE**	**0 dnevi**	**Čet 28.02.19**	**Čet 28.02.19**	**12KZ+19 dnevi**
14		**odsek Pragersko-Maribor Tezno**	**264 dnevi**	**Pet 19.04.19**	**Sre 22.04.20**	
15		vzpovstavljeni so pogoji na ostalih projektih za pričetek del ETCS na odseku (možno so zamiki do enega leta)	0 dnevi	Pet 19.04.19	Pet 19.04.19	
16		uvedba izvajalca v delo za odsek Pragersko-Maribor Tezno	0 dnevi	Pet 19.04.19	Pet 19.04.19	15
17		priprava projektne dokumentacije (izdelava, revizija in izdaja Sklepa o uspešno opravljeni	66 dnevi	Pet 19.04.19	Pet 19.07.19	16
18		**vgradnja sistema ERTMS/ETCS na odseku Pragersko-Maribor Tezno**	**198 dnevi**	**Pon 22.07.19**	**Sre 22.04.20**	
19		vgradnja sistema ERTMS/ETCS na odseku Pragersko-Maribor Tezno	103 dnevi	Pon 22.07.19	Sre 11.12.19	17
20		ES potrdilo o skladnosti s TSI	0 dnevi	Sre 11.12.19	Sre 11.12.19	19
21		poskusno obratovanje in predaja odsek	66 dnevi	Čet 12.12.19	Čet 12.03.20	20
22		ES izjava o skladnosti s TSI	0 dnevi	Čet 12.03.20	Čet 12.03.20	21
23		KONČNI TEHNIČNI PREGLED	0 dnevi	Pon 23.03.20	Pon 23.03.20	22KZ+7 dnevi
24		**OBRATOVALNO DOVOLJENJE**	**0 dnevi**	**Sre 22.04.20**	**Sre 22.04.20**	**23KZ+22 dnevi**
25		**odsek Maribor Tezno-Šentilj-d.m.**	**263 dnevi**	**Pet 16.04.21**	**Tor 19.04.22**	
26		vzpovstavljeni so pogoji na ostalih projektih za pričetek del ETCS na odseku (možno so zamiki do enega leta)	0 dnevi	Pet 16.04.21	Pet 16.04.21	
27		uvedba izvajalca v delo za odsek Maribor Tezno-Šentilj-d.m.	0 dnevi	Pet 16.04.21	Pet 16.04.21	26
28		priprava projektne dokumentacije (izdelava, revizija in izdaja Sklepa o uspešno opravljeni	66 dnevi	Pet 16.04.21	Pet 16.07.21	27
29		**vgradnja sistema ERTMS/ETCS na odseku Maribor Tezno-Šentilj-d.m.**	**197 dnevi**	**Pon 19.07.21**	**Tor 19.04.22**	
30		vgradnja sistema ERTMS/ETCS na odseku Maribor Tezno-Šentilj-d.m.	102 dnevi	Pon 19.07.21	Tor 7.12.21	28
31		ES potrdilo o skladnosti s TSI	0 dnevi	Tor 7.12.21	Tor 7.12.21	30
32		poskusno obratovanje in predaja odsek	66 dnevi	Sre 8.12.21	Sre 9.03.22	31
33		ES izjava o skladnosti s TSI	0 dnevi	Sre 9.03.22	Sre 9.03.22	32
34		KONČNI TEHNIČNI PREGLED	0 dnevi	Pet 18.03.22	Pet 18.03.22	33KZ+7 dnevi
35		**OBRATOVALNO DOVOLJENJE**	**0 dnevi**	**Tor 19.04.22**	**Tor 19.04.22**	**34KZ+22 dnevi**

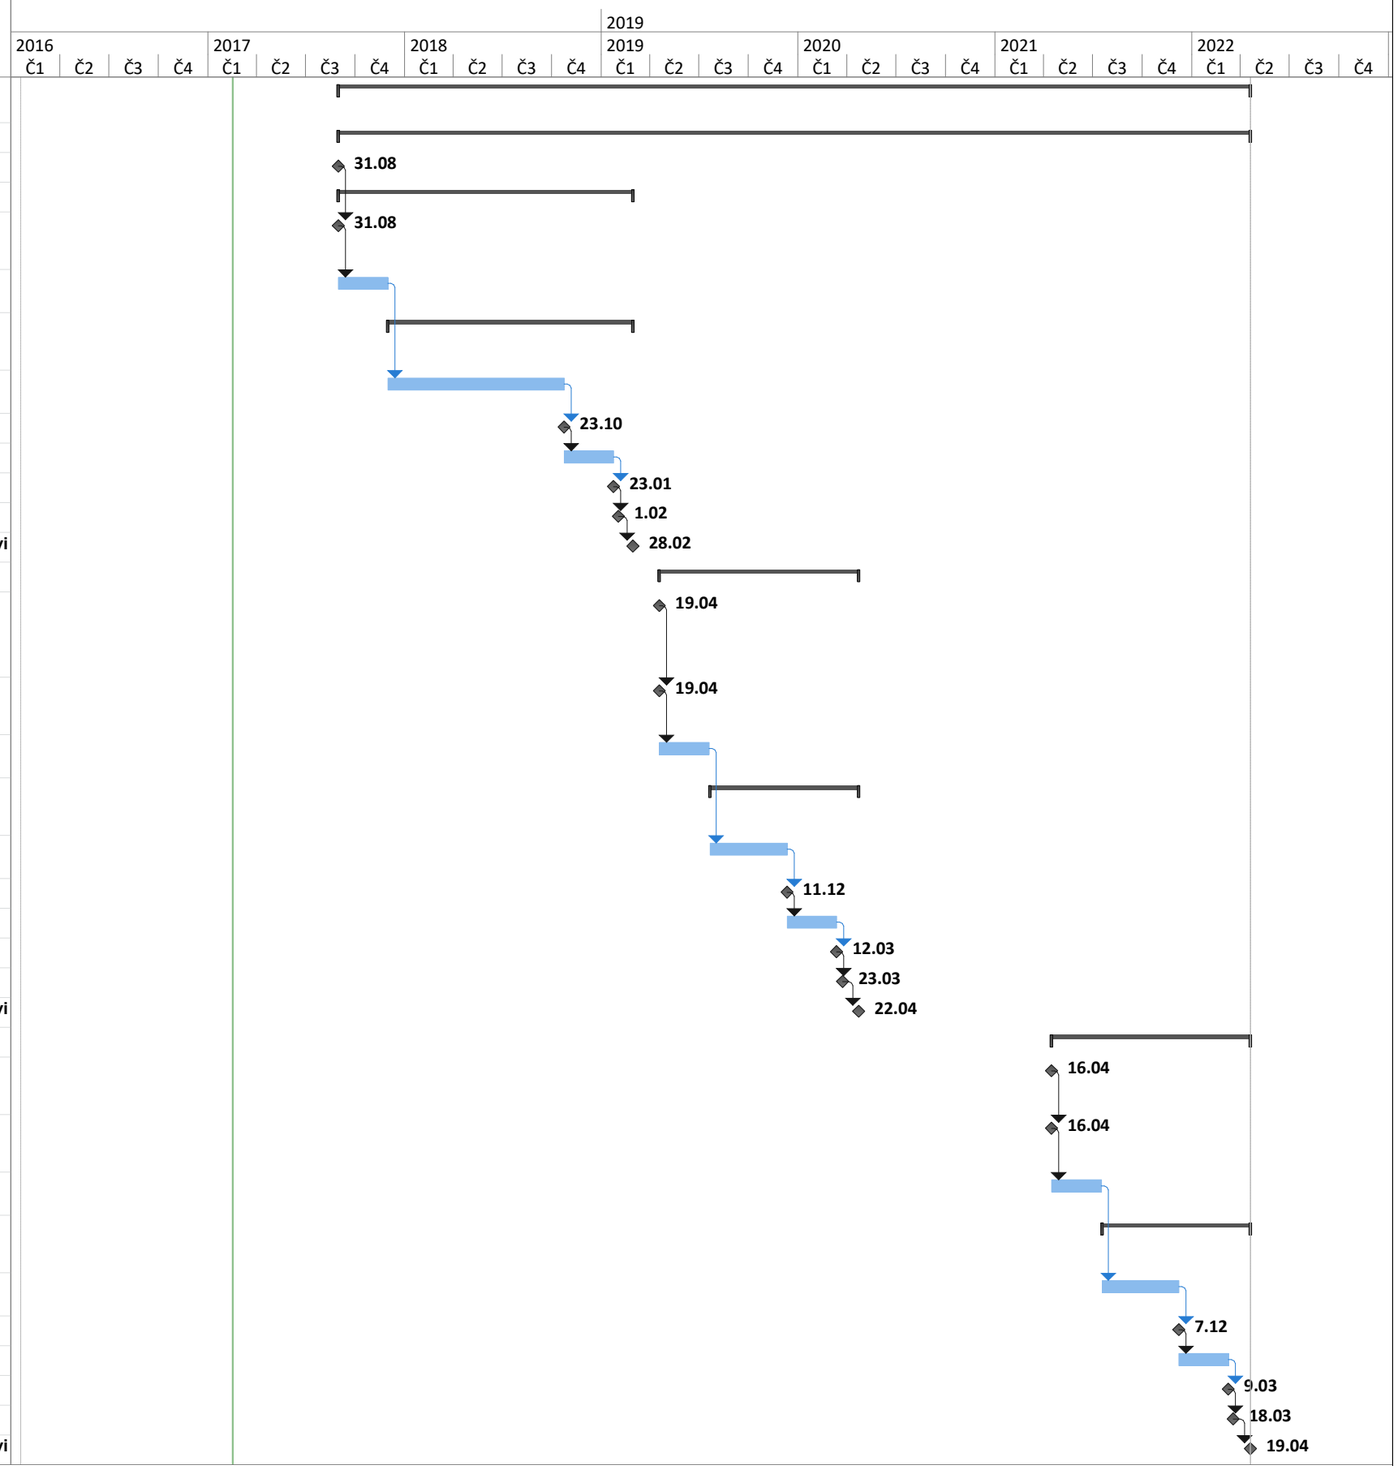

Projekt: Terminski plan ERTMS
Datum: Čet 16.02.17

Opravilo
Razdelitev
Mejnik
Povzetek
Povzetek projekta
Zunanja opravila
Zunanji mejnik
Neaktivno opravilo
Neaktivni mejnik
Neaktivni povzetek
Ročno opravilo
Le trajanje
Zbrani ročni povzetek
Ročni povzetek
Le začetek
Le dokončanje
Rok
Napredovanje
Ročno napredovanje
